

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

-Syyskuun aikana B- ja C-talojen rungot on asennettu. A-talossa ja yhteisrakennuksessa on sisäpuolen kipsilevytyöt tehty, ja tasoitetyöt ovat alkamassa. B-talon lattia on valettu, ja seuraavaksi valetaan C-talo viikolla 40. Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden kanssa.

-Vesikatot ovat valmiit A-talossa ja yhteisrakennuksessa. B-talo valmistuu viikolla 40.

-Maarakennustyöt ovat myös jatkuneet koko syyskuun: Etupihalla on kaivettu ja asennettu valaisin- ja lämmitystolppien kaapeleita, pohjattu asfaltoitavia alueita ja muotoiltu maan pintoja. Loput kaivut, maanpinnan profiloinnit sekä hulevesien viivytyskenttä tehdään lokakuun aikana.

-Maalämpökaivot on kaikki porattu ja lämmön muut asennukset alkavat viikolla 40.


-Viimeisen rakennuksen eli D-talon puurunkoelementtien asennus alkaa maanantaina viikolla 40.

-B-talon kipsilevytyöt alkavat viikolla 40.

-Pihakivien asennus alkaa A-talon päädyistä viikolla 40.

-C-talon vesikattotyöt alkavat viikolla 41.


-Puhallusvilla toimitetaan kolmeen ensimmäiseen rakennukseen viikolla 42 (A- ja B-talo sekä yhteisrakennus)

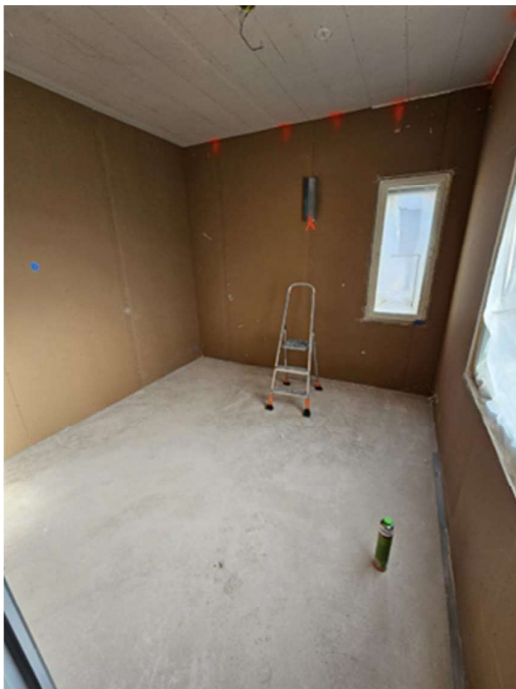

A-talon kipsilevytyöt ovat valmiit

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE

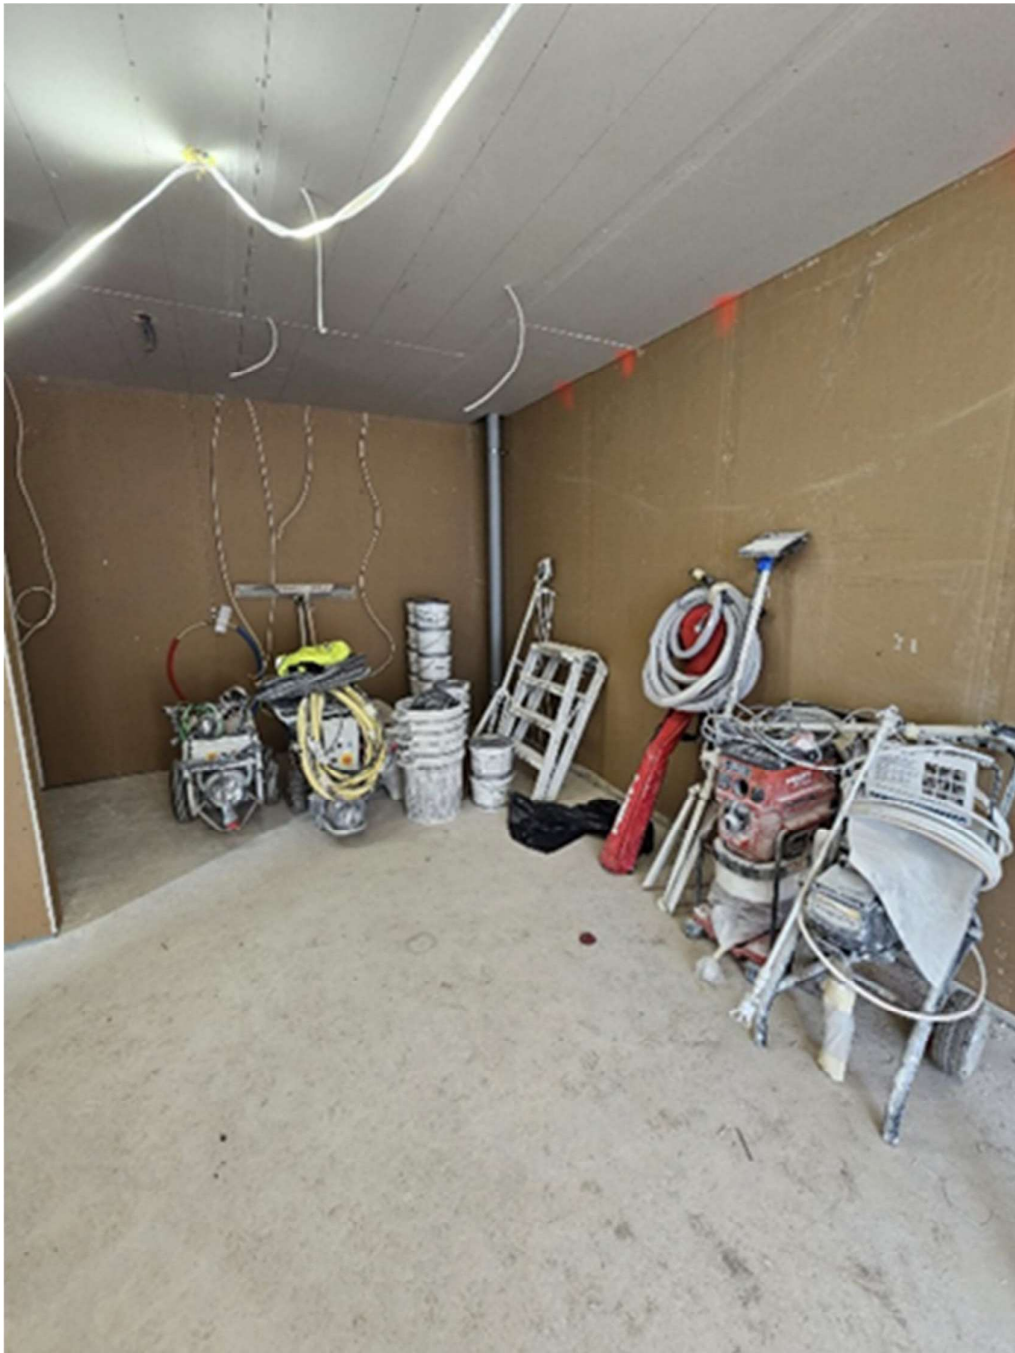

Sisäpuolen tasoite- ja maalaustöiden kalusto on jo toimitettu A-taloon

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Pysäköintialueen lämmitys- ja valaisintolppien asennus käynnissä

Janakkalan Kodit Heimolantie 5, Tervakoski

TYÖMAAN KUUKAUSITIEDOTE



Yleisnäkymä työmaasta. Myös Eltel Oy:n kaapeli-asennukset ovat alkaneet viikolla 39 (heidän kalustoaan kuvassa oikealla).

Tervakoskella 26.9.2025

Harri Laukkanen

Vastaava työnjohtaja 040 169 0960 harri.laukkanen@pallasrakennus.fi
